
GUIDE OFFERT · ARCHFIELD

Les 7 vérifications avant d'envoyer de l'argent pour votre chantier

Vous faites construire au pays depuis l'étranger ? Voici ce qu'il faut vérifier avant chaque versement, pour ne plus payer sur parole.

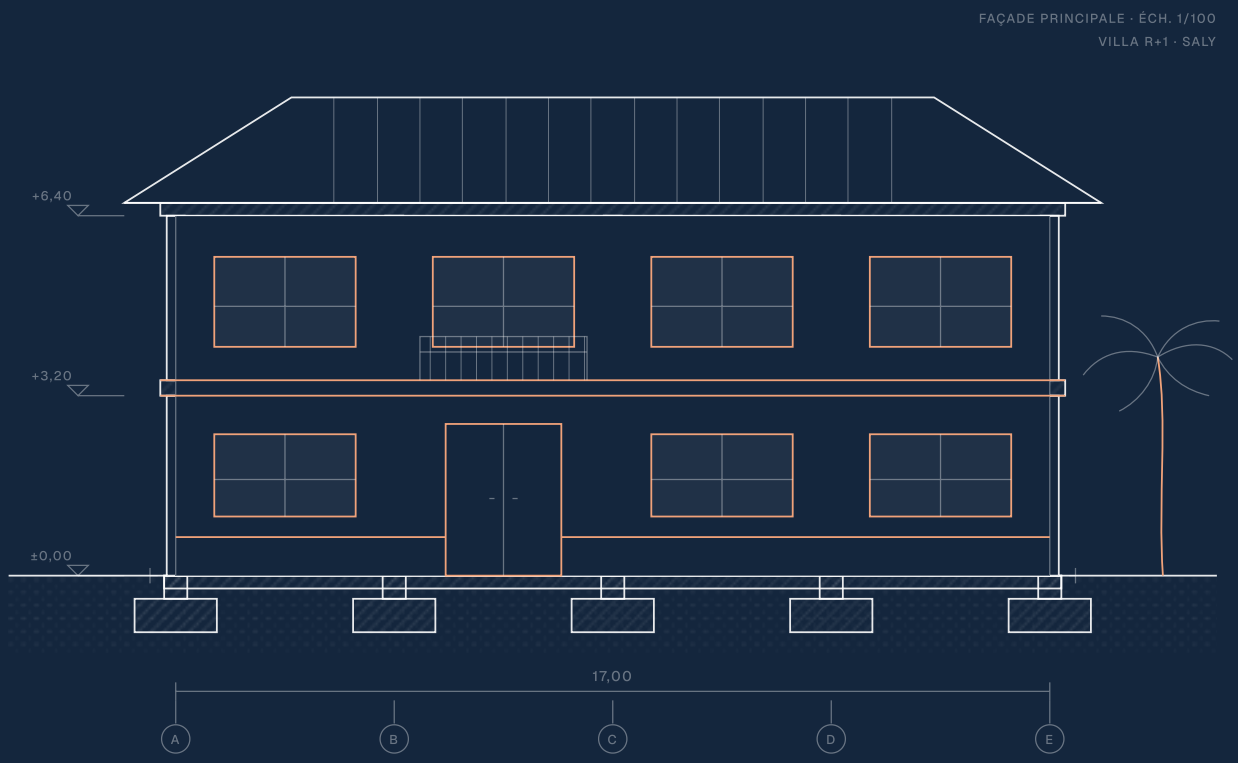

Archfield

Votre chantier, comme si vous y étiez.

Édition 2026

AVANT DE COMMENCER

Construire de loin, c'est possible. À une condition : ne rien payer sans preuve.

Beaucoup de projets de maison au pays échouent pour les mêmes raisons : un terrain mal sécurisé, un devis flou, de l'argent envoyé d'avance, et des nouvelles qui arrivent seulement quand il faut encore payer. Rien de tout cela n'est une fatalité.

Ce guide tient en une idée : **chaque paiement doit correspondre à un travail que vous pouvez vérifier**. Les 7 vérifications qui suivent s'appliquent que vous construisiez à Cotonou, Abidjan, Dakar, Lomé, Douala ou ailleurs.

1 Sécurisez le terrain avant tout

Pas de fondations sur un terrain dont la propriété n'est pas claire. Demandez le titre officiel du pays (par exemple le certificat de propriété foncière au Bénin, l'arrêté de concession définitive en Côte d'Ivoire, le titre foncier au Sénégal, au Togo ou au Cameroun) et faites-le vérifier auprès de l'administration foncière et par un notaire.

Le bon réflexe : ne payez jamais un terrain « sur photo », et ne laissez personne signer à votre place sans une procuration écrite et limitée.

2 Ayez des plans et un permis de construire

Des plans dessinés par un architecte ou un technicien, et un permis de construire demandé à la mairie. Les plans servent aussi à vérifier les travaux : on compare ce qui est construit à ce qui est dessiné.

3 Exigez un devis détaillé, poste par poste

Un bon devis donne les quantités et les prix : sacs de ciment, fer, agglos, sable, gravier, main-d'œuvre, par étape. Demandez deux ou trois devis pour comparer.

Le bon réflexe : un devis « forfait » sans quantités ne permet pas de vérifier. C'est lui qui ouvre la porte aux « il faut encore… ».

4 Signez un contrat écrit

Avec l'entreprise ou le chef de chantier : les étapes, les délais, le prix de chaque étape, qui achète les matériaux, ce qui se passe en cas de retard. Même court, un contrat signé vaut mieux qu'un accord oral.

5 Payez par étapes, jamais tout d'avance

Chaque versement correspond à une étape terminée et vérifiée (voir l'échéancier page suivante). Payez par un moyen qui laisse une trace (virement, mobile money) et gardez chaque reçu.

Le bon réflexe : pas d'argent liquide confié à un intermédiaire, pas de paiement à une autre personne que celle du contrat.

6 Demandez des preuves datées, chaque semaine

Des photos et des vidéos **datées et localisées**, prises sur le chantier, pas des photos envoyées sans date. Des reçus pour chaque achat de matériaux. Comparez les quantités livrées aux quantités du devis.

Le bon réflexe : demandez un appel vidéo depuis le chantier aux étapes importantes. Un chantier qui avance n'a rien à cacher.

7 Faites vérifier les étapes clés sur place

Une personne de confiance, ou un professionnel indépendant (technicien, bureau de contrôle), passe aux moments qui comptent. Le plus important : **contrôler le ferraillage avant de couler le béton** des fondations, des poteaux et de la dalle. Une fois le béton coulé, on ne voit plus rien.

À GARDER SOUS LA MAIN

Un exemple d'échéancier par étape

À adapter à votre devis et à votre contrat. Le principe compte plus que les chiffres : on paie l'étape suivante quand la précédente est vérifiée.

ÉTAPE	CE QUE VOUS VÉRIFIEZ AVANT DE PAYER LA SUITE	PART
Fondations	Implantation conforme aux plans, ferraillage contrôlé avant le coulage, photos datées	≈ 20 %
Élévation des murs	Hauteur atteinte, ouvertures aux bons endroits, chaînages, reçus du ciment et du fer	≈ 25 %
Dalle ou plancher	Ferraillage contrôlé avant le coulage, vidéo du coulage	≈ 20 %
Toiture	Charpente et couverture posées, photos depuis l'intérieur et l'extérieur	≈ 15 %
Finitions	Électricité, plomberie, enduits, menuiseries, visite finale	≈ 20 %

Les signaux d'alerte

L'urgence

« Il faut l'argent aujourd'hui, sinon le prix monte. » Une vraie urgence se prouve avec un devis ou une facture.

Les photos sans date

Floues, anciennes, prises de loin, ou toujours sous le même angle.

Les montants ronds

« Encore 500 000 » sans détail des quantités ni reçu.

Le refus de montrer

Pas d'appel vidéo, pas de visite possible, toujours « la semaine prochaine ».

Un autre bénéficiaire

On vous demande de payer une personne qui n'est pas dans le contrat.

Les étapes qui sautent

On demande l'argent de la toiture alors que les murs ne sont pas vérifiés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Archfield fait ces vérifications avec vous, depuis votre téléphone.

Votre chef de chantier ou votre entreprise publie sur Archfield. Vous suivez tout où que vous soyez, comme si vous y étiez.

Photos vérifiées

Chaque photo est datée et localisée sur le chantier. Fini les photos floues sans date.

Un rapport chaque jour

Ouvriers présents, livraisons reçues, message vocal du chef de chantier.

Validez, puis payez

Chaque étape a son budget. Vous validez l'étape avant de verser la suite.

Dépenses avec reçu

Chaque achat de matériaux arrive avec sa photo de reçu, à approuver ou refuser.

Votre cadeau : 2 mois offerts

Créez votre espace, invitez votre chef de chantier, et suivez votre chantier pendant deux mois sans payer. Sans engagement.

Le lien d'inscription est dans votre message

Ingénieurs, ou envie de le devenir ?

Vous êtes ingénieur, technicien du bâtiment, ou vous voulez vous lancer dans l'ingénierie ? Deux ebooks pour aller plus loin :

Ebook n° 1 · voir la présentation ↗

Ebook n° 2 · voir la présentation ↗

Ce guide donne des conseils généraux. Il ne remplace pas l'avis d'un notaire, d'un avocat ou d'un professionnel du bâtiment de votre pays. Les règles foncières et d'urbanisme changent d'un pays à l'autre : renseignez-vous auprès des administrations compétentes.
